FASE 5: RELATÓRIO TÉCNICO DE INCIDENTE
INCIDENTE 1 – CHAVE PRÉ-PARTILHADA (PSK) INCORRETA

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Divergência no parâmetro de autenticação IKE (Pre-Shared Key). O gateway da Sede em Lisboa estava configurado com a chave VPN2026 (maiúsculas), enquanto o gateway da Filial no Porto estava configurado com a chave vpn2026 (minúsculas).

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

A divergência na capitalização da PSK causa a falha imediata da negociação IKE na Fase 1. Como o segredo partilhado não coincide, os gateways não conseguem autenticar-se mutuamente nem estabelecer o túnel ISAKMP SA.

3. Solução Aplicada

Uniformização rigorosa da chave PSK em ambos os gateways de percurso para VPN2026. A alteração foi efetuada no menu de configuração IKE dos gateways e validada através do comando show crypto isakmp sa.

4. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Porto>en
pfSense-Porto#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Porto(config)#crypto isakmp key VPN2026 address 198.51.100.1
pfSense-Porto(config)#ex
pfSense-Porto#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pfSense-Porto#wr
Building configuration...
[OK]
pfSense-Porto#
```

Figura 1: Aplicação da Solução – Reconfiguração da Chave PSK para VPN2026 no Gateway da Filial

```
pfSense-Porto#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
203.0.113.1     198.51.100.1    QM_IDLE           1057    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 2: Validação da Associação de Segurança (ISAKMP SA no estado QM_IDLE ativo)

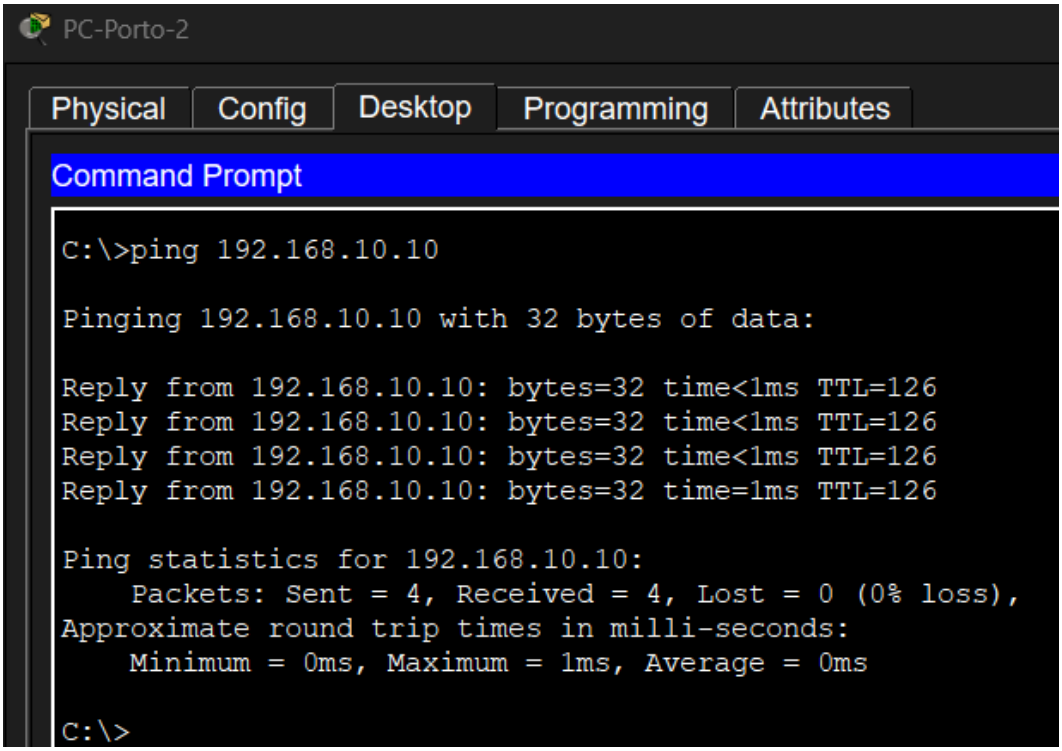


Figura 3: Teste de Conectividade ICMP (ping 192.168.10.10) a confirmar a estabilização do túnel VPN
